LE PLAN DE LANCEMENT

DE L'IDÉE À L'ATELIER.

Un Jarvis pour créer, fabriquer et faire connaître BOJ.ART.



L'ART RESTE LE VÔTRE.

Jarvis prend en charge l'organisation, les outils et la traçabilité. L'artiste garde la direction, la finition et le dernier regard.

7–8 machines

FDM et résine, à inventorier.

3 écrans

Une seule mémoire de projet.

3–5 k€

Budget PC ; matériel à réutiliser en priorité.

Photo : image du film BOJ.ART fourni. Dossier de préparation, non certification d'un atelier connecté. Projet indépendant d'UNUM et de M-Tek.

À LIRE ENSEMBLE

Ce que nous lançons.

Une trajectoire concrète, avec des résultats à montrer à chaque passage.

L'objectif

Une demande devient un dossier, puis un modèle, une fabrication contrôlée, un contenu fidèle à la marque et une offre suivie. Le tout depuis le poste central.

PARTIE	CONTENU	PAGES
Faire le point	État réel, écarts et preuve technique livrée.	03–07
Mettre en place	Huit étapes : accès, installation, voix, mémoire, 3D, fabrication, contenus, commerce.	08–15
Lancer le pilote	Recette, sûreté, tests, budget et responsabilités.	16–20
Faire évoluer	Indicateurs, innovations, fichiers de reprise et sources.	21–25

La décision proposée aux associés : valider un pilote complet sur une FDM et une résine avant l'extension au parc. Aucun achat de tour avant inventaire du matériel disponible.

Déjà préparé

Conception d'ensemble, documents, médias de référence et outils décrits dans l'historique.

À prouver sur place

Voix, performances locales, profils, connexions, pièces physiques et publication réelle.

Les promesses antérieures et les capacités d'un logiciel ne valent pas preuve que la tour BOJ.ART les exécute déjà.

RÉAUDIT / MÉTHODE

Une preuve par affirmation.

Nous séparons ce qui est observé aujourd'hui, ce qui est rapporté et ce qui reste à installer.

NIVEAU DE PREUVE	CONSTAT AU 20 OCTOBRE	CONSÉQUENCE
Vérifié dans ce livrable	Deux ZIP relus, document d'audit V10, PDF antérieurs et un film BOJ.ART disponibles.	Le kit et le périmètre peuvent être réaudités.
Exécuté ici	Génération CAO, contrôle du STL, 22 tests de simulation et 7 contrôles de la démonstration.	Preuves limitées à ce démonstrateur.
Rapporté dans le fil	Tour V11, vitrine, corrections et tests annoncés précédemment.	À reprendre depuis leurs sources et à retester.
Non revalidé en direct	Les deux sites n'ont pas été accessibles depuis cet environnement ; source applicative complète absente.	Cela ne prouve pas une panne du site.
Non installé sur cible	PC non connecté, matériel exact inconnu, aucun essai vocal ou physique.	Aucune mise en production revendiquée.

La conclusion de l'audit

Le concept est cohérent. La principale dette est la jonction entre les composants : installation, fichiers versionnés, profils, reçus d'exécution et opérations humaines.

Périmètre : documents et artefacts accessibles, documentation primaire et nouveau prototype isolé. Pas de nouvel audit de sécurité du code V11 en production.

RÉAUDIT / DÉCISIONS

Ce qu’il faut corriger avant de lancer.

Des écarts d’intégration, pas un problème à résoudre en empilant davantage d’agents.


PRIORITÉ	ÉCART	DÉCISION
P0	Le ZIP de reprise est présenté comme préparation ; il dépend de Python et couvre peu Windows.	Ajouter un audit Windows natif. Ne pas l’appeler installateur complet.
P0	Le PDF et le navigateur ne transportent pas les sources, les bases et tous les médias.	Récupérer un export complet, vérifier les empreintes et restaurer sur une copie.
P0	Une réponse perdue n’est ni un échec ni une confirmation de départ.	Conserver l’état inconnu, réconcilier avec la machine ; ne pas réémettre aveuglément.
P1	Un modèle peut produire une réponse conforme mais un mauvais choix.	Évaluer la décision, la cible et la révision ; garder des règles déterministes.
P1	La fin de l’impression ne donne pas une œuvre terminée.	Planifier retrait, traitement, assemblage, peinture, contrôle et emballage.
P1	Un prix calculé n’est pas un devis accepté ; un rendu n’est pas un post publié.	Conserver des identifiants et des preuves propres à chaque étape.

P0 = bloquant avant exploitation réelle. P1 = nécessaire avant élargissement. Il s’agit des décisions de ce réaudit, pas de nouvelles failles du site démontrées.

PREUVE RÉALISÉE / PAS SEULEMENT UN SCHÉMA

Un vrai objet 3D est livré.

Le premier exemple concret matérialise la chaîne : paramètres → CAO → exports → contrôle → affichage.

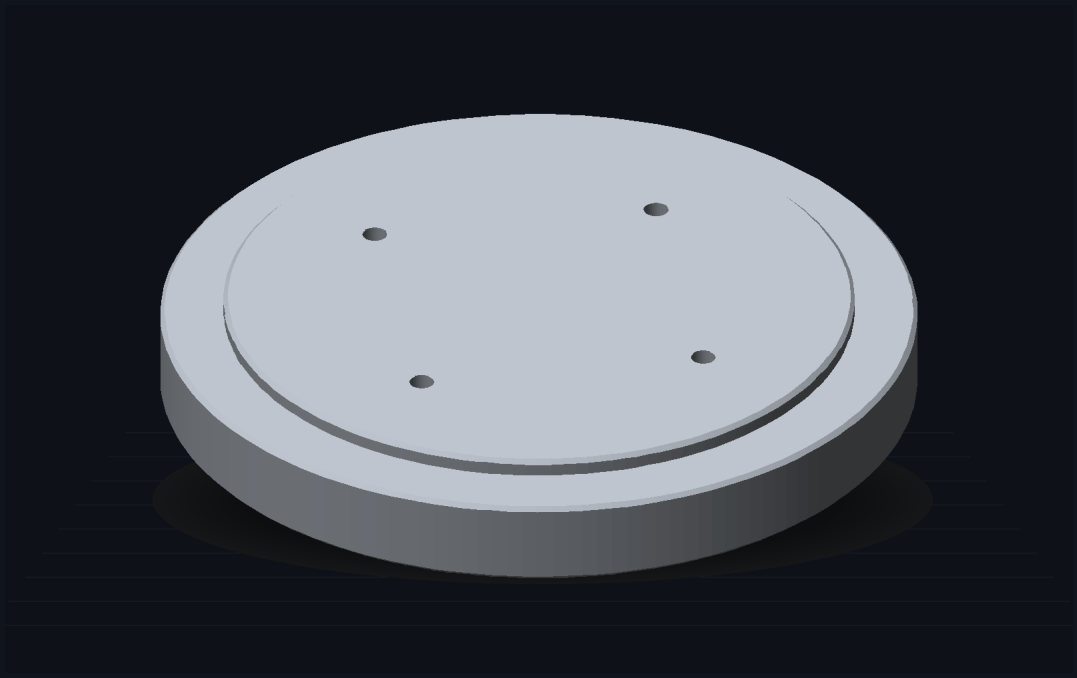

Ø 180 × 24 mm

Dimensions nominales du socle CAO.

4 perçages

Ø 6 mm, cercle d'implantation Ø 96 mm.

1 solide valide

STEP, STL, GLB et script de construction fournis.

Le STL a été relu : maillage fermé, orientations cohérentes et 4 752 triangles. Son enveloppe est de 180 × 179,964 × 24 mm ; l'écart de discrétisation sur Y est inférieur à 0,04 mm.


Ce que cela prouve : une géométrie exploitable et traçable peut être construite et affichée. **Ce que cela ne prouve pas :** la compréhension vocale, un appel Jev, la résistance du socle ou son imprimabilité sur une machine inconnue.

Génération : CadQuery 2.8.0, exécutée ici. Paramètres de démonstration proposés. Les 22 tests de sûreté concernent un simulateur séparé ; aucune imprimante n'a été sollicitée. [S4]

EXPÉRIENCE / MAQUETTE DE DÉMONSTRATION

Trois vues. Un même dossier.

Le visuel ci-dessous est une capture du nouveau démonstrateur local, pas du dashboard en production.

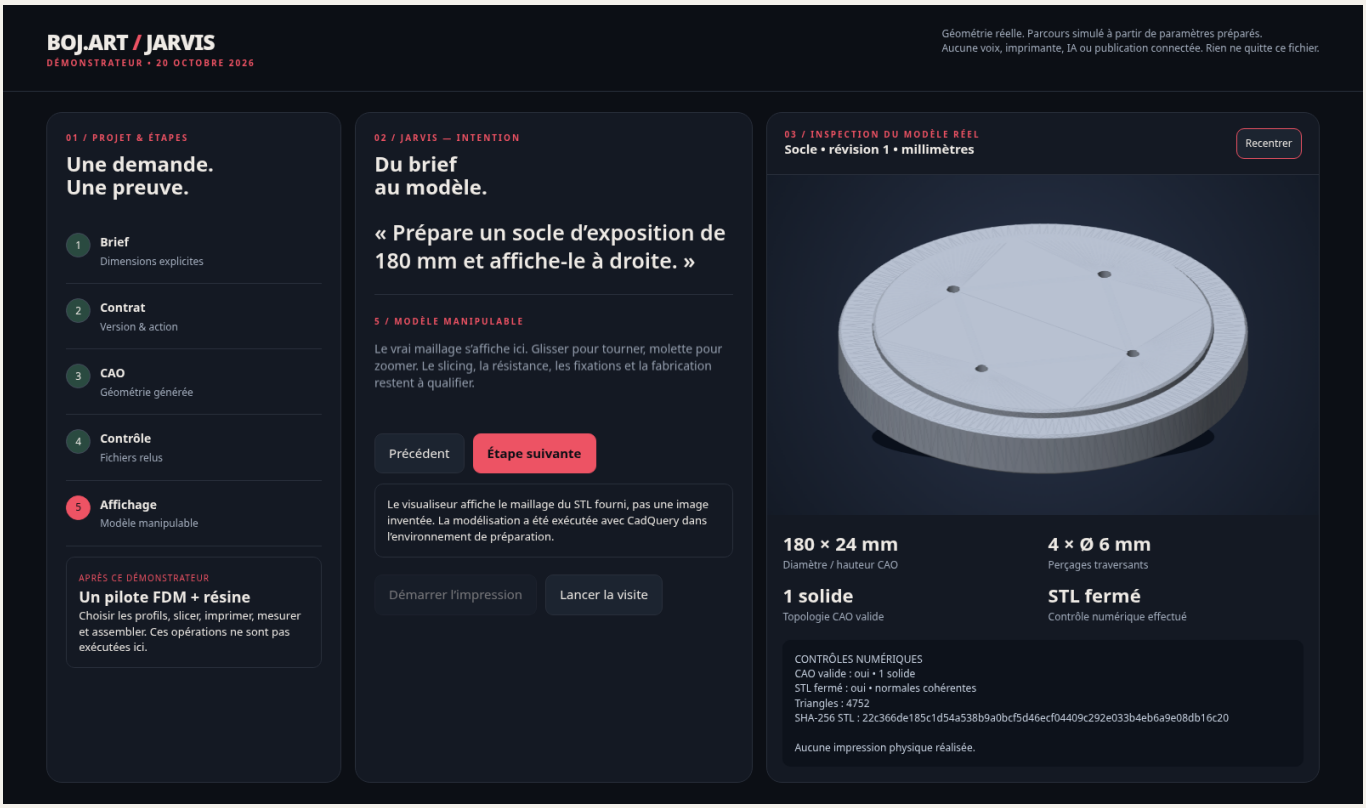

01 / Atelier

Ressources, lots et interventions. Montrer ce qui avance et ce qui bloque.

02 / Jarvis

Intention, prochaine décision, preuves et commande. Conserver la cible visible.

03 / Création

Modèle réel, plans, films et comparaisons. Afficher la bonne révision.

La démonstration permet de tourner le vrai maillage, de parcourir les cinq étapes et de consulter ses contrôles. Elle fonctionne sans compte ni accès réseau. Les commandes physiques y sont volontairement inactives.

Sept contrôles d'interface réussis sous Chromium en environnement de préparation : navigation, dessin du maillage, preuve, visite guidée, débordements bureau/mobile et erreurs JavaScript. Pas de mesure sur la tour.

ARCHITECTURE CIBLE

Jarvis coordonne. Les outils exécutent.

Un service local conserve les faits ; le modèle ne devient pas l'autorité de sécurité.

01

Comprendre

La voix ou le texte est associé au projet, à sa révision et à une intention.

02

Décider

Jev ou un décideur local choisit parmi les actions et les vues admises. Les calculs exacts restent dans le logiciel.

03

Valider

Le service contrôle le fichier, le profil, les permissions et l'état de la ressource.

04

Exécuter

CAO, slicer, rendu vidéo ou connecteur réalise l'opération. Un reçu est conservé.

05

Observer

L'écran montre le résultat attesté, l'échec ou l'état inconnu. Un affichage ne remplace pas une preuve.

Une même entrée, deux niveaux

L'assistant s'occupe de la conversation et du contexte. Le moteur de commandes applique les contrats. Les documents récupérés et les messages clients sont des données, jamais des instructions d'administration.

Jev reçoit du texte ou des champs structurés ; il n'analyse pas directement les images, l'audio ou les fichiers STL. L'analyse de ces médias appartient à d'autres moteurs. [S1]

ÉTAPE 01 / RETROUVER LE TERRAIN

Auditer avant d'acheter.

Le budget actuel est de 3 000 à 5 000 €. Une partie du matériel existe peut-être déjà.

À OBSERVER	POUR DÉCIDER
CPU, RAM, GPU, VRAM, pilotes	Choisir des modèles réellement compatibles et laisser de la marge à la vidéo.
Disques et sauvegardes	Séparer système, projets et médias ; disposer d'une restauration vérifiée.
Écrans, audio, alimentation, réseau	Vérifier les trois sorties, le bruit, le microphone et la stabilité sous charge.
Logiciels et fichiers existants	Réutiliser les outils, profils, rushes et projets sans les déplacer au départ.
Imprimantes et finition	Relever modèles, firmware, matériaux, volumes et interfaces réellement disponibles.

Amélioration livrée : audit Python révisé et script Windows PowerShell sans dépendance Python. Ils ne lancent ni téléchargement, ni installation, ni recherche dans les fichiers personnels.

Limites : les observations concernent uniquement la machine exécutant le script. Les valeurs manquantes restent inconnues. Le script Windows est écrit mais non testé sur Windows dans cette livraison.

Critère de passage

Un inventaire sauvegardé permet de comparer deux scénarios : réemploi du matériel et tour neuve. Les incompatibilités et les pièces à remplacer sont explicitement listées.

Livré dans 02_Audit_PC. L'utilisateur autorise l'accès ; le responsable d'intégration pilote ensuite les vérifications. Le PC cible n'a pas été inspecté.

ÉTAPE 02 / LE VRAI PLUG-AND-PLAY

Installer sans vous faire administrer six outils.

Cible d’expérience : un lanceur, un diagnostic visible et un retour arrière possible.

01

Préserver

Importer une copie des sources, du journal, des STL, des médias et des paramètres ; vérifier leurs empreintes.

02

Préparer

Installer uniquement les composants retenus pour le système réel. Conserver versions, licences et journaux.

03

Configurer

Créer le service atelier, le coffre, les droits, les écrans et les contrôles de santé.

04

Recevoir

Tester le démarrage, l’arrêt, le fonctionnement hors Internet et la restauration avant tout lancement machine.

Les actions humaines incompressibles

Autoriser l’accès au PC, approuver les permissions système nécessaires et connecter les comptes sociaux. Ces consentements ne seront pas contournés ; la préparation technique doit être automatisée autour d’eux.

Le lanceur définitif doit être construit et éprouvé pour l’OS choisi. Les scripts d’inventaire livrés aujourd’hui ne l’installent pas. Un blocage doit afficher sa cause et l’action attendue, sans boucle de relance opaque.

Claude Code peut servir à installer et maintenir le projet via des outils locaux autorisés ; cela ne rend pas automatiquement son modèle local. Il reste distinct du Jarvis d’exploitation. [S13]

ÉTAPE 03 / INTELLIGENCE ET VOIX

Parler à l'atelier, pas à une boîte noire.

Choisir les moteurs sur des tests français, du bruit réel et une charge concurrente représentative.

RÔLE	CANDIDAT / RÈGLE DE CHOIX
Transcrire et répondre	whisper.cpp pour la transcription ; Piper pour la synthèse. Choisir un modèle multilingue et vérifier la licence de la voix. [S8–S9]
Comprendre et expliquer	Modèle généraliste local sélectionné par tests. Le plus grand n'est pas forcément le plus réactif sur trois écrans.
Décider rapidement	Jev hébergé facultatif ; Ollama documente un endpoint local /v1/systemone et des modèles comme Nimble et Tev1. [S1–S2]
Conserver la qualité	Version exacte, licence des poids, résultats français et comportement d'abstention. Une compatibilité d'API n'est pas une équivalence de qualité.

Au départ : microphone proche et bouton pour parler. « Affiche la pièce » peut ouvrir immédiatement la bonne vue. « Lance le lot » exige en plus la bonne version, une machine prête et une autorisation valide.

Critère de passage

Sur un jeu de référence convenu : aucune exécution vers une mauvaise cible, demandes ambiguës bloquées et latence mesurée pendant l'affichage 3D et la vidéo. Les objectifs chiffrés seront fixés après le premier benchmark.

Priorité à l'assistant et aux commandes ; les rendus lourds attendent si nécessaire. Pas de bascule cloud silencieuse. Les ressources GPU et les modèles chargés sont visibles. [S3]

ÉTAPE 04 / MÉMOIRE BOJ.ART

Retrouver la source, pas inventer le souvenir.

Importer notre contexte comme un dossier versionné ; il ne suit pas automatiquement le compte Claude.

Mémoire artistique

Rushes, œuvres, montages, emblèmes, cadrages, gestes et règles de marque.

Mémoire technique

Modèles sources, révisions, recettes qualifiées, essais et défauts observés.

TYPE DE DONNÉE	SOURCE DE VÉRITÉ
Documents et médias	Catalogue de fichiers avec empreinte, version, droit d'usage et timecode.
Stock, commandes, disponibilité	Base métier et connecteurs, avec date du dernier état connu.
Recommandations	Décision et références utilisées, séparées des résultats réellement obtenus.

La recherche documentaire, souvent appelée RAG, apporte au modèle les passages pertinents. Elle ne remplace ni le stock réel, ni un journal de commandes. Les originaux restent conservés ; un disque débranché apparaît comme indisponible.

Critère de passage

« Retrouve le plan où cette pièce est peinte » ouvre le bon fichier au bon timecode. Une modification de source invalide les extraits ou index qui en dépendent.

L'archive complète de 29 vidéos évoquée auparavant n'est pas présente dans ce dossier d'audit. Un film de 22,7 s a été vérifié ici ; l'inventaire complet devra être restauré et rapproché des originaux.

ÉTAPE 05 / DU BESOIN À LA GÉOMÉTRIE

Deux voies de création.


Une pièce cotée et une sculpture originale ne demandent pas le même moteur ni la même validation.

Voie paramétrique

Socles, boîtiers, gabarits et variantes connues. Paramètres bornés, géométrie reproductible et exports techniques.

Voie artistique

Figurines et sculptures inédites. Références, génération ou sculpture assistée, choix artistique puis préparation de fabrication.

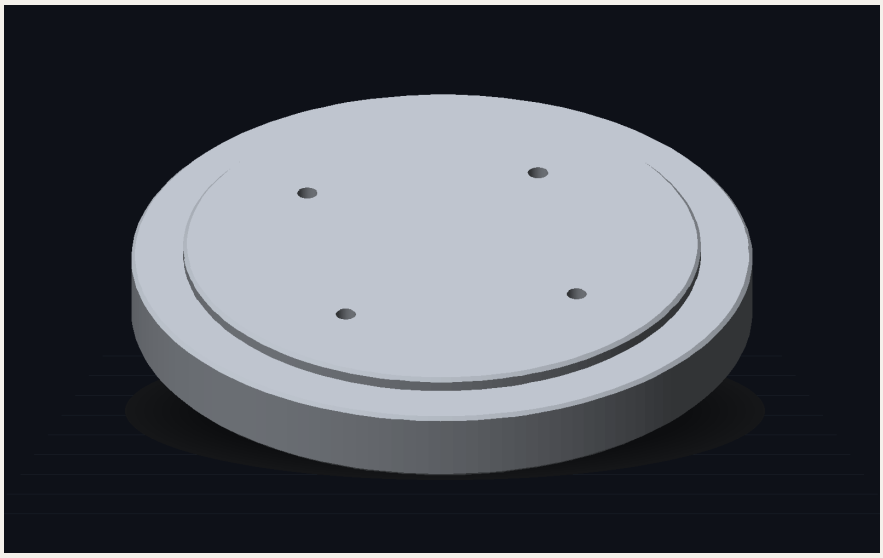

Le premier pilote part d'un modèle détenu ou d'une création originale autorisée. On conserve le fichier de conception, pas seulement le STL. Pour une grande œuvre, découpes, détrompeurs, jeux et renforts doivent être conçus avec l'assemblage.

CadQuery permet notamment les exports STEP, STL et glTF. Le script et ses paramètres conservent ici la recette de construction. Le poids d'une image ou la beauté d'un rendu ne prouvent pas la géométrie interne. [S4]

Critère de passage

Géométrie inspectable, unités explicites, version identifiée et raccord testable. L'aperçu du dashboard renvoie au fichier réellement exporté.

ÉTAPE 06 / PRODUCTION ORCHESTRÉE

Le bon morceau. La bonne machine.

Respecter la préférence résine pour les figurines et FDM pour les socles, puis vérifier chaque pièce.

RESSOURCE	CONTRAINTE À INTÉGRER
FDM	Volume, buse, matériau, sens des efforts, profil, supports et préparation du plateau.
Résine	Orientation, supports, section, drainage des cavités, retrait, lavage et polymérisation. [S7]
Postes de finition	Opérateur, station partagée, séchage, assemblage, peinture, contrôle et emballage.
Planning	Durées issues du profil réel, marges fondées sur les essais, ressources réservées et reprises ciblées.

Le slicer produit les fichiers machine. PrusaSlicer propose une interface en ligne de commande ; UVtools apporte une inspection de formats résine. Moonraker permet des commandes sur les installations compatibles. Rien de cela ne garantit l'accès à toutes les imprimantes du parc. [S5–S6]

Une commande unique ne signifie pas une seule vague. Jarvis répartit les lots admissibles et prévoit les cycles nécessaires. La pièce terminée doit être retirée et la machine préparée avant un nouveau départ.

Critère de passage


Un travail est retrouvé après une coupure et un reçu perdu est rapproché de la machine. Aucune nouvelle commande n'est renvoyée lorsque le résultat précédent est inconnu.

Le lavage, la peinture et les autres gestes restent humains tant qu'un équipement physique adapté n'est pas qualifié. Prévoir captage et organisation des opérations polluantes. [S12]

ÉTAPE 07 / LE STUDIO DE MARQUE

L’art de BOJ.ART devient le récit.

Le détail attire, le geste démontre le travail, l’œuvre révèle le résultat, la signature conclut.

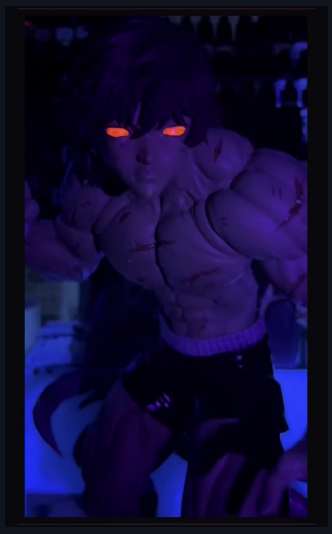

LE DÉTAIL



LE GESTE



L’ŒUVRE



LA SIGNATURE

Prévoir les prises pendant la fabrication : vue d’ensemble, détail matière, geste, assemblage et échelle. Associer les rushes à l’œuvre et à son étape, avec une autorisation de diffusion documentée.

Le montage doit être reproductible : sources, timecodes, recadrages, titres, rythme, son et version. Remotion est un moteur candidat pour les compositions paramétrées ; sa licence est à examiner selon l’usage. [S10]

Publier, puis vérifier

Un export n’est pas une publication. Connecter les comptes via un service admis, conserver l’identifiant du post et rapprocher les erreurs. Certaines options TikTok demandent encore une finalisation dans l’application. [S11]

Vues extraites du film BOJ.ART fourni : 22,7 s, 720 × 1280, 30 i/s, aucune piste audio détectée. Ce n’est pas un nouveau tournage. La charte finale doit être approuvée par l’artiste.

ÉTAPE 08 / ACQUISITION ET DEVIS

La vitrine doit créer de vraies commandes.

Une même référence relie la demande, la proposition, la fabrication et la livraison.

01

Recevoir et qualifier

Le formulaire donne un reçu de conservation. Une personne est responsable du premier examen et des questions restantes.

02

Chiffrer et proposer

Ventiler conception, matière, préparation, temps machine, finition, reprises et emballage. Émettre un devis versionné.

03

Faire accepter et planifier

Relier accord, visuel approuvé et paiement à la version concernée. Replanifier tout changement de périmètre.

04

Livrer et apprendre

Contrôle final, photos, remise, facture et SAV rejoignent le dossier. Les temps réels améliorent les devis suivants.

Trois offres lisibles

Œuvres et éditions • Créations sur mesure • Pièces et prototypes. La robotique s'élargit par fonctions et essais définis, pas par une promesse universelle.

À compléter : identité de BOJ.ART, coordonnées, conditions, droits des créations et médias, politique de conservation des contacts. Une demande de devis ne vaut pas inscription à une prospection publicitaire. [S14]

Le document V10 décrit un transfert par export/import contrôlé entre vitrine et atelier. La synchronisation automatique de bout en bout n'est pas démontrée ici.

PILOTE / PREMIER RÉSULTAT COMMUN

Une œuvre. Une fabrication. Un film.

Avant la sculpture d'un mètre : prouver toute la chaîne sur un projet représentatif et maîtrisable.

Le socle FDM

Version paramétrique adaptée au modèle, au matériau et au profil réel.

Le détail résine

Élément original ou autorisé ; raccord et finition vérifiés.

Le contenu

Un montage d'environ 20 s et une fiche qui décrivent le vrai résultat.

LE PILOTE LIVRE	CE QUI DOIT ÊTRE OBSERVABLE
Un dossier complet	Brief, fichiers, dimensions, révisions et droits associés.
Deux recettes	FDM et résine, chacune liée à une machine et une matière.
Une réalisation conforme	Assemblage, aspect et usage contrôlés ; écarts documentés.
Un coût de référence	Temps humains, consommation, reprises et emballage mesurés.
Une boucle commerciale	Fiche, demande de test, devis de démonstration et suivi cohérent.
Une reprise éprouvée	Journal restauré, fichiers ouvrables et aucun départ involontaire.

Feu vert pour l'extension

Les associés valident le résultat réel, le temps passé et les reprises. Les sept à huit machines sont ajoutées progressivement, profil par profil.

FIABILITÉ / INDISPENSABLE À L'AUTONOMIE

La sécurité ne dépend pas du modèle.

Plus l'atelier devient autonome, plus les limites doivent être explicites et testables.

RISQUE	EXIGENCE DE CONCEPTION
Mauvaise cible ou version	Vérifier projet, pièce, fichier, profil, machine et droit d'action juste avant exécution.
Réponse perdue / doublon	Identité stable de commande, état persistant et verrou de ressource. Un résultat inconnu demande une réconciliation.
Document ou skill malveillant	Fichiers clients traités comme données. Scripts de conception isolés ; pas de terminal libre ni de secrets dans le modèle.
Fuite de données	Services locaux limités et authentifiés ; réseau machines séparé de la vitrine ; droits par rôle ; aucun cloud implicite.
Perte de la tour	Sauvegarde cohérente de la base, des fichiers, profils et médias ; clés à part ; restauration testée sur copie.
Risques physiques	Préparation opérateur, protections machine actives, arrêt indépendant et organisation du local. [S12]

Deux niveaux d'accord

Les opérations numériques réversibles et les recettes déjà qualifiées peuvent être préautorisées. Un changement matériel, une recette inédite ou une dépense/publication hors cadre déclenche une validation ciblée.

Un verrou local ne garantit pas une exécution physique exactement une fois. La reprise dépend du protocole réel et de la capacité à observer le travail présent sur la machine.

RECETTE / NE PAS CONFONDRE TEST ET PROMESSE

Les preuves à réclamer.

La mesure prime sur un pourcentage de maturité inventé.

ÉPREUVE	CRITÈRE DE RÉCEPTION
Voix sous bruit	Cible et paramètres compris sur le corpus convenu ; toute ambiguïté est explicitée.
Charge simultanée	Commande et écrans restent utilisables pendant un rendu ; latence et mémoire relevées.
Fichier remplacé	Un résultat ancien n'est jamais appliqué à une nouvelle révision.
Départ répété / réponse perdue	Pas de relance aveugle ; identité du travail et état réel rapprochés.
Coupure Internet	Fonctions locales utilisables ; publications en attente, pas d'envoi cloud surprise.
Restauration	Sources, STL, médias, profils et documents commerciaux retrouvés depuis une sauvegarde cohérente.
Publication	Bon compte, bon contenu, identifiant de post et statut confirmé.
Commande client	Accord, prix, délai, révisions, qualité finale et remise reliés au même dossier.

22 tests réussis ici

Contrats et reprise sur un simulateur isolé, plus analyseurs d'inventaire.

7 contrôles réussis ici

Navigation et rendu du démonstrateur sous Chromium, bureau et mobile.

Ces résultats ne réexécutent pas les anciens tests V11 et ne qualifient ni Windows, ni un fournisseur IA, ni une imprimante. Rapports JSON et code de test inclus.

INVESTISSEMENT / BUDGET DÉCIDÉ

3 000 à 5 000 € : investir après inventaire.

Les montants ci-dessous sont une répartition de plafond, pas des prix marchands ni un devis.

ENVELOPPE	SCÉNARIO 3 000 €	SCÉNARIO 5 000 €
Tour / composants à compléter	2 100 €	3 500 €
Sauvegarde et protection électrique	400 €	650 €
Audio et petits besoins réseau	250 €	350 €
Réserve d'intégration matérielle	250 €	500 €
TOTAL MAXIMAL	**3 000 €**	**5 000 €**

Ordre des décisions : réemployer ce qui convient ; mesurer le besoin GPU ; vérifier RAM, alimentation, refroidissement, ports vidéo et stockage ; seulement ensuite comparer des offres actualisées.

Le modèle retenu doit tenir avec sa mémoire de contexte et les autres usages. Les moteurs lourds peuvent travailler en file d'attente. Acheter de la puissance n'élimine pas le travail d'intégration.

Hors de cette enveloppe

Imprimantes, consommables, ventilation/finition, licences, abonnements, électricité et travail d'intégration sont à chiffrer séparément. Le présent dossier n'en invente pas le coût.

Budget utilisateur courant : 3 000–5 000 €. Les anciens scénarios à 8 000 € et les prix GPU évoqués dans le fil ne constituent pas un devis actualisé.

DÉPLOIEMENT / QUI FAIT QUOI

Un lancement par preuves, pas par dates promises.

Les durées ne seront fixées qu'après l'inventaire des machines, logiciels et accès.

LOT	TRAVAIL	PASSAGE AU SUIVANT
A / Accès + socle	L'intégrateur récupère et sauvegarde ; le propriétaire approuve les périmètres.	Inventaire, sources et restauration disponibles.
B / Poste intelligent	L'intégrateur installe les moteurs locaux, les écrans et la mémoire ; l'équipe teste les demandes.	Commandes comprises et sources retrouvées.
C / Atelier pilote	L'opérateur prépare une FDM et une résine ; l'artiste valide les raccords et le rendu.	Pièce contrôlée, reprises et temps mesurés.
D / Studio + vente	L'artiste valide la signature ; le responsable commercial traite la demande de test.	Film rendu, fiche, reçu et devis versionné.
E / Extension	L'intégrateur ajoute les profils et comptes un à un ; chaque usage est reçu.	Capacité et qualité stables sur le parc étendu.

Votre effort doit rester concentré

Donner l'accès, valider les choix artistiques et commerciaux, préparer les machines et juger le résultat. Les installations, journaux et contrôles techniques sont pris en charge par l'intégration.

Le propriétaire reste maître des comptes et budgets. L'IA ne doit ni accepter un devis au nom du client ni masquer une action physique dont le résultat est inconnu.

ÉVOLUTION / RESTER À LA POINTE

Une avance qui se mesure.

Le meilleur système est celui qui livre mieux, pas celui qui installe le plus de nouveautés.

AMÉLIORATION PROPOSÉE	GAIN À MESURER
Passeport de chaque pièce	Retrouver la recette et réimprimer la bonne révision sans reconstituer tout le projet.
Catalogue paramétrique BOJ.ART	Créer rapidement des variantes de socles, supports et boîtiers déjà maîtrisés.
Simulation de planning	Comparer des plans admissibles en incluant finition et disponibilité humaine. Les temps non calibrés restent indicatifs.
Captation au bon moment	Associer un geste réel à son dossier pour réduire la recherche des rushes et enrichir les contenus.
Impact des modifications	Montrer ce qu'un changement de taille ou de quantité invalide : modèle, profil, devis, délai et montage.

Tableau de pilotage : temps humain par pièce conforme, taux de reprise, temps de réponse vocal, délai tenu, coût complet, restauration réussie et demandes qualifiées devenues commandes. Les valeurs seront mesurées, pas simulées.

Règle de mise à jour

Une version candidate est comparée à la version utilisée sur les mêmes cas BOJ.ART, avec sa licence et son empreinte. Déploiement seulement après résultat concluant, puis possibilité de retour arrière.

CE QUE VOUS AVEZ ENTRE LES MAINS

Le pack de lancement est concret.

Ce livrable complète les travaux antérieurs sans modifier les deux sites publiés.

DOSSIER	CONTENU RÉEL
01_Demonstration	Socle STEP/STL/GLB, script paramétrique, contrôles, maquette HTML autonome avec rotation et visite guidée.
02_Audit_PC	Audit Python amélioré, audit Windows natif, lanceurs et rapport d'observations sans installation.
03_Preuve_Et_Tests	Simulateur sans réseau ni pilote machine, 22 tests reproductibles, rapport des 7 contrôles d'interface.
04_Documents	Ce dossier, protocole de déploiement, registre des preuves et sources consultées.

Pour montrer le projet : ouvrir le PDF ; utiliser la démonstration pour manipuler le socle. Le HTML autonome ne demande aucun compte. L'accès à un fichier local peut dépendre des règles du navigateur.

Pour reprendre sur le PC : transmettre le pack et les exports des applications au responsable d'intégration ou à Claude Code autorisé. Le nouveau kit ne contient ni les bases clients, ni les sources complètes de V11.

Statut sans ambiguïté

Démo réalisée et testée ici. Préparation PC améliorée. Installateur complet, modèles IA, voix, machines et comptes sociaux encore à raccorder et qualifier.

Les launchers ne contournent pas les politiques de sécurité du système. L'utilisateur n'a pas à saisir de commande ; un blocage doit être traité par l'intégrateur.

SOURCES / 1

Références techniques primaires.

Consultées le 20 octobre 2026. Elles attestent les capacités des composants, pas celles de la tour.

S1 TypeSafe — Models

Décisions structurées ; entrée textuelle ; version et évaluation en français.
https://docs.typesafe.ai/models

S2 Ollama — Decision models

API locale /v1/systemone annoncée le 29 septembre 2026 ; candidats à évaluer.
https://registry.ollama.com/blog/ollama-now-supports-jev-style-decision-models

S3 Ollama — FAQ

Mémoire de contexte, chargement et réglages du service local.
https://docs.ollama.com/faq

S4 CadQuery — Import / Export

Formats de construction et d'échange, dont STEP, STL et glTF.
https://cadquery.readthedocs.io/en/latest/importexport.html

S5 PrusaSlicer / UVtools

Tranchage automatisable ; UVtools complète l'inspection résine : github.com/sn4k3/UVtools.
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer

S6 Moonraker — Printer Administration

Commandes et états, uniquement sur les installations compatibles.
https://moonraker.readthedocs.io/en/latest/external_api/printer/

S7 Prusa — Hollowing

Évidement, drainage et préparation résine.
https://help.prusa3d.com/article/hollowing_117285

Les liens sont actifs. Les versions, licences et intégrations seront relues au moment du déploiement. Aucune disponibilité future d'un service n'est garantie.

SOURCES / 2

Voix, contenu, exploitation et preuves.

Les critères de réception, budgets et priorités du dossier sont des propositions de projet.

S8–S9 whisper.cpp / Piper

Voix locale. Piper : https://github.com/OHF-Voice/piper1-gpl ; examiner aussi la licence de la voix.
https://github.com/ggml-org/whisper.cpp

S10 Remotion — Documentation et licence

Compositions vidéo programmables ; conditions : https://www.remotion.dev/license.
https://www.remotion.dev/docs/

S11 TikTok / Metricool

Publication : contraintes d'audit et de consentement. Metricool :
https://help.metricool.com/fr/planifier-et-publier-sur-tiktok-bkepi.
https://developers.tiktok.com/docs/en/content-sharing-guidelines

S12 INRS — Fabrication additive

Organisation des opérations et prévention des expositions.
https://www.inrs.fr/risques/fabrication-additive/prevention.html

S13 Claude Code — Overview

Outils pour intervenir sur un projet local dans le périmètre autorisé.
https://code.claude.com/docs/en/overview

S14 CNIL — Formulaires et conservation

Information à adapter à BOJ.ART. Durées : https://www.cnil.fr/fr/passer-laction/les-durees-de-conservation-des-donnees.
https://www.cnil.fr/fr/exemples-de-formulaire-de-collecte-de-donnees-caractere-personnel

Preuves internes relues : kit de préparation PC, contrat d'intégration IA du 20/10, audit acquisition V10 du 19/10, PDF antérieurs et film fourni. Les états V11 décrits dans la conversation n'ont pas été réauditables depuis leurs sources complètes dans cette session.

Les rapports, résultats et empreintes des artefacts nouveaux sont dans le pack. Ce document n'est ni un audit juridique, ni une certification sécurité, ni une recette industrielle.

DÉCISION / DÉMARRER SANS PERDRE LA VISION

ON LANCE UN PILOTE. PUIS ON CHANGE D'ÉCHELLE.

L'objectif reste ambitieux : une idée devient une création, une fabrication et une histoire que BOJ.ART peut vendre.



Maintenant

Conserver le pack, examiner la démonstration et répartir les rôles.

Dès l'accès au PC

Inventorier, restaurer, mesurer puis décider des achats.

Avant l'extension

Valider une pièce mixte, sa vidéo et son parcours client.

Le contrat de confiance

Aucune fonction ne sera dite opérationnelle parce qu'un écran existe. Elle le sera lorsqu'elle accomplira sa tâche sur le matériel réel et que son résultat pourra être vérifié.

Votre atelier garde son art et sa signature. Jarvis devient l'organisation qui permet de les reproduire, les documenter et les faire découvrir à plus de clients.

Rappel : voix et machines non connectées dans ce livrable. Budget de la tour à confirmer après réemploi. La démonstration ne modifie aucun site ni aucune donnée client.
